


Stan realizacji Deklaracji Inwestycyjnej w ramach Porozumienia UKE - TP

Status po 7 miesiącach realizacji

Warszawa, 21 maja 2010



Program Inwestycyjny TP

Agenda

▪ **Komentarz**

- Ogólny status realizacji zobowiązań
- Raport wykonania
- Inwestycje w realizacji
- Realizacja inwestycji według kategorii

Program Inwestycyjny TP

Komentarz

- Minęło 7 miesięcy od daty podpisania Porozumienia i rozpoczęcia realizacji Programu Inwestycyjnego przez TP.
- W tym czasie TP i UKE dokonały szczegółowych uzgodnień realizacyjnych, których wyniki zostały opublikowane na stronach www UKE i TP, łącznie z planem inwestycyjnym TP na 2010 rok.
- Plany inwestycyjne TP zawierają ponad 10 tys. projektów inwestycyjnych różnej wielkości, obejmujących ponad 4000 miejscowości zlokalizowanych w ok. 2000 gmin na terenie całego kraju.
- TP podjęła następujące zadania, szczególnie istotne z punktu widzenia Programu Inwestycyjnego:
 - uruchomiła realizację kompleksowych inwestycji w 68 gminach zakwalifikowanych do obszarów białych plam, obejmujących ponad 150 tys. łączy, z czego ok. 60 tys. łączy planowanych jest do realizacji do końca 2010 roku.
 - uruchomiła projekty inwestycyjne dla ponad tysiąca nowo powstających budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych.
 - rozpoczęła kompleksowe modernizacje sieci, w tym likwidację systemów multipleksujących PCM, które uniemożliwiały oferowanie usług szerokopasmowych.
 - zleciła budowę sieci oraz instalacje stacji dostępu radiowego dla zapewnienia usług wszystkim Klientom oczekującym w trybie Odroczonego Terminu Realizacji.
- Realizując Program Inwestycyjny TP wybudowała i udostępniła do 20 maja 2010 r. infrastrukturę pozwalającą na uruchomienie 100 000 łączy szerokopasmowych.
- Uwzględniając zrealizowane inwestycje oraz spodziewane rezultaty już uruchomionych projektów, TP objęła inwestycjami infrastrukturę stacjonarnego dostępu szerokopasmowego łącznie dla ok. 600 000 łączy, co stanowi 50% zobowiązań inwestycyjnych przewidzianych w Porozumieniu.
- Przebieg realizacji Programu Inwestycyjnego jest systematycznie kontrolowany przez niezależnych audytorów.
- TP współpracuje z samorządami przy realizacji przedsięwzięć lokalnych. Udostępnia informacje o swojej infrastrukturze jak również uzgadnia realizowane plany inwestycyjne. TP przygotowała modele możliwej współpracy z samorządami przy realizacji projektów z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych.

Program Inwestycyjny TP

Wyjaśnienie zakresu prezentowanych danych

- Dane przedstawione są w podziale na kategorie inwestycyjne, zgodnie z nomenklaturą Porozumienia:
 - 1.1 nowe i istniejące budownictwo
 - 1.2 białe plamy
 - 1.3 deinstalacja PCM/radia (PCM - urządzenia do zwielokrotniania linii abonenckich)
 - 1.4 przyłącza w ramach SSI (SSI - Szybka Ścieżka Inwestycji)
 - 2.1 skracanie pętli
 - 2.2 budowa dodatkowych węzłów
 - 2.3 doposażenie kartami dostępowymi
 - 2.3 modernizacja sieci
- Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do kolejnych etapów cyklu inwestycyjnego:
 - przygotowanie popytu
 - przygotowanie inwestycji
 - realizacja inwestycji
 - oddanie inwestycji do użytku
- Informacje w końcowej sekcji „Realizacja inwestycji według kategorii” przedstawiają zaangażowanie TP w proces inwestycyjny wg stanu na 21 maja 2010r. w zestawieniu z danymi z poprzedniego raportu z 2 kwietnia 2010r.
- Dla każdej raportowanej kategorii przedstawione są dane odnoszące się do realizacji całości Programu Inwestycyjnego jak również do Planów TP na 2010r.

Program Inwestycyjny TP

Agenda

- Komentarz
- **Status realizacji zobowiązań**
- Raport wykonania
- Inwestycje w realizacji
- Realizacja inwestycji według kategorii

Program Inwestycyjny TP

Status realizacji zobowiązań

Plan

Rok	2009	2010				2011				2012				
Obszar/ tys. linii	4Q 2009	1Q 2010	2Q 2010	3Q 2010	4Q 2010	1Q 2011	2Q 2011	3Q 2011	4Q 2011	1Q 2012	2Q 2012	3Q 2012	4Q 2012	Razem
tereny wiejskie	7,0	4,2	9,2	20,5	62,1	20,4	29,9	43,5	49,2	14,7	36,8	41,5	12,9	351,9
małe i średnie miasta	13,5	10,7	17,0	27,0	53,5	34,6	40,1	46,4	51,8	22,7	41,0	37,0	12,9	408,1
aglomeracje	16,5	11,1	17,9	28,4	55,4	36,0	41,1	49,1	57,0	24,6	47,2	41,5	14,2	440,0
Razem	37	26	44	76	171	91	111	139	158	62	125	120	40	1200,0
	37	317				499				347				1200,0

Wykonanie

Rok	209	2010				2011				2012				
Obszar/ tys. linii	4Q 2009	1Q 2010	2Q 2010	3Q 2010	4Q 2010	1Q 2011	2Q 2011	3Q 2011	4Q 2011	1Q 2012	2Q 2012	3Q 2012	4Q 2012	Razem
tereny wiejskie	9,9	12,4	4,4											26,7
małe i średnie miasta	19,5	23,8	9,1											53,4
aglomeracje	9,0	5,7	6,2											19,9
Razem	38,4	41,9	19,7											100,0
	38,4	61,6												100,0




■ Produkcja wykonana
 ■ Inwestycje w realizacji
 ■ Inwestycje w przygotowaniu
 Popyt w trakcie przygotowań

← 600 →

Plan 2009-2012



Plan 2010

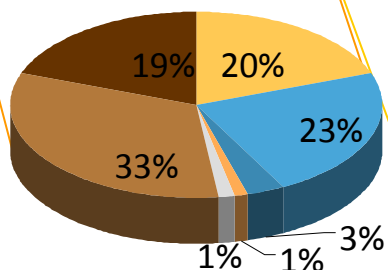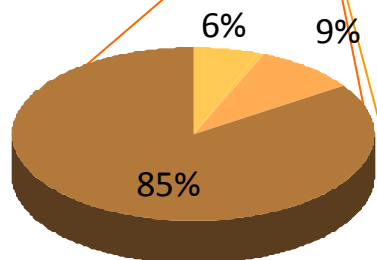

Projekt: POROZUMIENIE

1.1 Nowe i istniejące budownictwo

1.2 Białe plamy

1.3 deinstalacja PCM/radio

1.4 Przyłącza w ramach SSI

2.1 Skracanie pętli

2.2 Budowa dodatkowych węzłów /

2.2 Doposażanie kartami dostępowymi

2.3 Modernizacja sieci

Aktualizacja: 20.05.2010

Program Inwestycyjny TP

Agenda

- Komentarz
- Status realizacji zobowiązań
- **Raport wykonania**
- Inwestycje w realizacji
- Realizacja inwestycji według kategorii

Program Inwestycyjny TP

Raport wykonania od 22 października 2009 r. do 20 maja 2010 r.

Kategoria produkcji	4 kw. 2009	1 kw. 2010	2 kw. 2010	Łącznie
1.1 nowe i istniejące budownictwo	13 138	2 478	873	16 489
1.2 białe plamy	0	0	300	300
1.3 deinstalacja PCM/radia	0	0	0	0
1.4 przyłącza w ramach SSI	3 131	4 115	1 109	8 355
2.1 skracanie pętli	0	0	0	0
2.2 budowa dodatkowych węzłów	17 840	23 592	14 392	55 824
2.3 doposażanie kartami dostępowymi	4 296	11 680	3 056	19 032
2.3 modernizacja sieci	0	0	0	0
Łącznie	38 405	41 865	19 730	100 000
Likwidacja OTR	133	385	40	558

OTR – umowy z odroczonym terminem realizacji

PCM – urządzenia do zwielokrotniania linii abonenckich

SSI – szybka ścieżka inwestycji

Program Inwestycyjny TP

Agenda

- Komentarz
- Status realizacji zobowiązań
- Raport wykonania
- **Inwestycje w realizacji**
- Realizacja inwestycji według kategorii

Program Inwestycyjny TP

Inwestycje w realizacji – stan na 21 maja 2010 r.

Kategoria produkcji / termin oddania do użytku	2010	2011	2012	Łącznie
1.1 nowe i istniejące budownictwo	60 338	42 951	89	103 378
1.2 białe plamy	69 845	70 818	11 998	152 661
1.3 deinstalacja PCM/radia	10 685	2 937		13 622
2.1 skracanie pętli	3 789	5 883	128	9 800
2.2 budowa dodatkowych węzłów	105 280	4 016		110 296
2.3 modernizacja sieci	60 230			60 230
Łącznie	311 167	126 605	12 215	449 987
Likwidacja OTR – sieć kablowa	5 660			5 660
Likwidacja OTR – instalacja G4F	8 590			8 590
Likwidacja OTR - łącznie	14 250			14 250

G4F – technologia dostępu radiowego (GSM stacjonarny)

OTR – umowy z odroczone terminem realizacji

PCM – urządzenia do zwielokrotniania linii abonenckich

Program Inwestycyjny TP

Agenda

- Komentarz
- Status realizacji zobowiązań
- Raport wykonania
- Inwestycje w realizacji
- **Realizacja inwestycji według kategorii**

Nowe budownictwo (segment 1.1)

Status

CEL POROZUMIENIA: 235 000 linii		Dane 21.05.2010	Dane 02.04.2010
Łączna liczba linii dla łączy szerokopasmowych		146 359 (62 % celu)	120 244
w tym			
	oddanych do użytku	16 489	15 806
	na etapie realizacji	103 378	70 107
	na etapie przygotowania zadania	26 492	34 331
Liczba linii dla łączy szerokopasmowych na rok 2010		63 689	81 544
w tym			
	oddanych do użytku	3 351	2 668
	na etapie realizacji	60 338	61 207
	na etapie przygotowania zadania	0	17 669

Białe plamy (segment 1.2)

Status

CEL POROZUMIENIA: 150 000 linii		Dane 21.05.2010	Dane 02.04.2010
Łączna liczba linii dla łączy szerokopasmowych (68 gmin)		152 961 (102% celu)	152 130
w tym			
	oddanych do użytku	300	0
	na etapie realizacji	152 661	150 835
	na etapie PTE	0	1 295
Liczba linii dla łączy szerokopasmowych na rok 2010 (68 gmin)		70 145	71 796
w tym			
	oddanych do użytku	300	0
	na etapie realizacji	69 845	71 796
	na etapie PTK	0	0

PTE – projekt techniczno-ekonomiczny

Deinstalacja PCM/radia (segment 1.3)

Status

CEL POROZUMIENIA: 40 000 linii		Dane 21.05.2010	Dane 02.04.2010
Łączna liczba linii dla łączy szerokopasmowych		14 627 (37 % celu)	14 480
w tym			
	oddanych do użytku	0	0
	na etapie realizacji	13 622	13 358
	na etapie przygotowania zadania	1 005	1 122
Liczba linii dla łączy szerokopasmowych na rok 2010		10 685	10 662
w tym			
	oddanych do użytku	0	0
	na etapie realizacji	10 685	10 662
	na etapie przygotowania zadania	0	0

PCM – urządzenia do zwielokrotniania linii abonenckich

Skracanie pętli (segment 2.1)

Status

CEL POROZUMIENIA: 58 000 linii		Dane 21.05.2010	Dane 02.04.2010
Łączna liczba linii dla łączy szerokopasmowych		15 432 (27 % celu)	14 166
w tym			
	oddanych do użytku	0	0
	na etapie realizacji	9 800	58
	na etapie przygotowania zadania	5 632	14 108
Liczba linii dla łączy szerokopasmowych na rok 2010		6 429	4 332
w tym			
	oddanych do użytku	0	0
	na etapie realizacji	3 789	1
	na etapie przygotowania zadania	2 640	4 331

Budowa dodatkowych węzłów (segment 2.2)

Status

CEL POROZUMIENIA: 323 000 linii		Dane 21.05.2010	Dane 02.04.2010
Łączna liczba linii dla łączy szerokopasmowych		156 576 (48 % celu)	157 624
w tym			
	oddanych do użytku	55 824	41 496
	na etapie realizacji	104 896	42 480
	na etapie przygotowania zadania	0	73 648
Liczba linii dla łączy szerokopasmowych na rok 2010		134 720	135 704
w tym			
	oddanych do użytku	37 984	23 592
	na etapie realizacji	100 880	42 000
	na etapie przygotowania zadania	0	70 112

Modernizacja sieci (segment 2.3)

Status

CEL POROZUMIENIA: 340 000 linii		Dane 21.05.2010	Dane 02.04.2010
Łączna liczba linii dla łączy szerokopasmowych		78 930 (23 % celu)	75 830
w tym			
	oddanych do użytku	0	0
	na etapie realizacji	60 230	0
	na etapie przygotowania zadania	18 700	75 830
Liczba linii dla łączy szerokopasmowych na rok 2010		78 930	75 830
w tym			
	oddanych do użytku	0	0
	na etapie realizacji	60 230	0
	na etapie przygotowania zadania	18 700	75 830
